



**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOS DE
ACARAÚ-CE**

PROPOSTA: 1078194-80

914377/2024

Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAU-CE
 MUNICÍPIO: ACARAU-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SINAPI/CE REF: 09/2024 TABELA SICRO 07/2024 TABELA SEINFRA 28 - NÃO DESONERADO



B.D.I 20,73%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,15


ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				46.028,00		
1.1	COMP1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	381,25	460,28	46.028,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.628,21		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	187,01	225,78	1.016,01	
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10.028,32	0,30	0,36	3.610,20	
3		MOVIMENTO DE TERRA				26.775,81		
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.028,32	2,21	2,67	26.775,61	
4		OBRAS DE DRENAGEM				294.179,80		
4.1.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.436,68	35,67	43,06	147.983,44	
4.1.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.436,68	1,67	2,02	6.942,09	
4.2.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.436,68	33,56	40,52	139.254,27	
5		URBANIZAÇÃO				896.141,27		
5.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	8.997,31	81,33	98,19	883.445,87	
5.2	5213863	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	5,60	257,6	311,00	1.741,60	
5.3	5213440	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID.	20,00	453,65	547,69	10.953,80	
TOTAL GERAL C/ BDI INCLUSO (R\$)							1.267.750,88	

Mara Cristina Martins
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: 260307738-4
 CREA/SP: 5060851224

MARA CRISTINA MARTINS
 Engenheira Civil
 RNP: 260307738-4 CREA: 5060851224-SP

CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAU-CE
 MUNICÍPIO: ACARAU-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SINAPI/CE REF: 09/2024 TABELA SICRO 07/2024 TABELA SEINFRA 28 - NÃO DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU



MEMORIAL DE CÁLCULO										
2										
SUBITEM	DESCRIÇÃO									UNID.
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA									M2
PLACA PADRÃO DE OBRA					EXTENSÃO	x	ALTURA	x	QUANT.	=
					3,00	x	1,50	v	1,00	=
									TOTAL	=
2.2	DESCRIÇÃO									UNID.
	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018									M
Nome da Localidade	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Largura			PQL	
	Int	Frac	Int	Frac						
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	6,00			3.240,00	=
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	6,00			3.240,00	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	6,00			840,00	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	5,00			210,15	=
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	7,00			758,17	=
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	5,00			1.740,00	=
									TOTAL	=
3	DESCRIÇÃO									UNID.
	MOVIMENTO DE TERRA									M
3.1	DESCRIÇÃO									UNID.
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019									M2
Nome da rua	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Largura	Área		PQL	
	Int	Frac	Int	Frac						
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	6,00	3.240,00		3.240,00	=
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	6,00	3.240,00		3.240,00	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	6,00	840,00		840,00	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	5,00	210,15		210,15	=
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	7,00	758,17		758,17	=
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	5,00	1.740,00		1.740,00	=
									TOTAL	=
4	DESCRIÇÃO									UNID.
	OBRAS DE DRENAGEM									M
4.1	DESCRIÇÃO									UNID.
	MEIO FIO									M
4.1.1	DESCRIÇÃO									UNID.
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM									M
Nome da rua	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Quant			PQL	
	Int	Frac	Int	Frac						
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	2,00			1.080,00	=
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	2,00			1.080,00	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	2,00			280,00	=

2



MEMORIAL DE CALCULO

ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	2,00			84,06	84,06	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	2,00			216,62	216,62	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	2,00			696,00	696,00	=	
										TOTAL	=	
4.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021											M
Nome da rua	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Quant				PQL		
	Int	Frac	Int	Frac								
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	2,00			1.080,00	1.080,00	=	1
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	2,00			1.080,00	1.080,00	=	1
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	2,00			280,00	280,00	=	
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	2,00			84,06	84,06	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	2,00			216,62	216,62	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	2,00			696,00	696,00	=	
										TOTAL	=	3
4.2	SARJETA											
SUBITEM	DESCRIÇÃO											UNID.
4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016											M
Nome da rua	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Quantidade				PQL		
	Int	Frac	Int	Frac								
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	2,00			1.080,00	1.080,00	=	1
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	2,00			1.080,00	1.080,00	=	1
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	2,00			280,00	280,00	=	
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	2,00			84,06	84,06	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	2,00			216,62	216,62	=	
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	2,00			696,00	696,00	=	
										TOTAL	=	3
5	URBANIZAÇÃO											
SUBITEM	DESCRIÇÃO											UNID.
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020											M2
Nome da rua	Estaca inicial		Estaca final		Distância	Largura	Largura s/ Sargeta	Área	Sargeta	PQL		
	Int	Frac	Int	Frac								
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	E0	0	E27		540,00	6,00	5,40	2.916,00	0,60	2.916,00	=	2
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	E27	0	54		540,00	6,00	5,40	2.916,00	0,60	2.916,00	=	2
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	E0	0	E7		140,00	6,00	5,40	756,00	0,60	756,00	=	

CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAÚ-CE
 MUNICÍPIO: ACARAÚ-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SINAPI/CE REF: 09/2024 TABELA SICRO 07/2024 TABELA SEINFRA 28 - NÃO DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ



MEMORIAL DE CALCULO											
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03	E7	0	E9	2,03	42,03	5,00	4,48	184,93	0,60	184,93	=
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34	E9+2,03	0	14	10,34	108,31	7,00	6,40	693,18	0,60	693,18	=
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	E14+10,34		E31	18,34	348,00	5,00	4,40	1.531,20	0,60	1.531,20	=
										TOTAL	=
5.2	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE										=
	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	RESUMO	AREA D PLACA	M2
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	R1	1	R7	1	R19d	1,000	R28	1,00	4,00	0,280	=
			A-5b	1					1,00	0,280	=
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	A-5b	1	R7	1					2,00	0,280	=
	A-1b	2	A-1a	2	R19d	1,000	R28	1,00	6,00	0,280	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	A-21a	1			R19d	1,000			2,00	0,280	=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03									0,00	0,280	=
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34					R19d	1,000			1,00	0,280	=
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	A-21a	1	R1	1	R19d	2,000			4,00	0,280	=
										TOTAL	M2
5.3	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E										=
	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	PLACA	QUANT	RESUMO		
CORREGO DE ANA VERISSIMO E0 a E27	R1	1	R7	1	R19d	1,000	R28	1,00	4,00		=
			A-5b	1					1,00		=
CORREGO DE ANA VERISSIMO E27 A E 54	A-5b	1	R7	1					2,00		=
	A-1b	2	A-1a	2	R19d	1,000	R28	1,00	6,00		=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 01- EST 0 A 7	A-21a	1			R19d	1,000			2,00		=
ILHA DOS COQUEIROS TRECHO 02- EST 7 A 9+2,03									0,00		=
ILHA DOS COQ TRECHO 03- EST 9+2,03 A 14+10,34					R19d	1,000			1,00		=
ILHA DOS COQ TRECHO 04- EST 14+10,35 A E31+18,34	A-21a	1	R1	1	R19d	2,000			4,00		=
										TOTAL	M2

Mara Cristina Martins
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: 260307738/4
 CREA/SP: 5060851224

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAU-CE

CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80

B.D.I 20,73%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,15

TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL DE
Acarau
Juntos Trabalhando pela Renovação



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	2,0000	20,2600	40,5200
Total:			40,5200

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

I1100 ESMALTE SINTETICO

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

M2	1,0200	39,0300	39,8106
L	1,0000	31,8800	31,8800
M	4,5000	16,0900	72,4050
KG	0,1500	15,9900	2,3985

Total: 146,4941

Total Simples: 187,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 187,01

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)

MAO DE OBRA

I2445 TOPOGRAFO

I2382 NIVELADOR

I0037 AJUDANTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,0020	35,6000	0,0712
H	0,0020	29,6400	0,0593
H	0,0040	21,1000	0,0844
Total:			0,2149

MATERIAIS

I0775 TEODOLITO (CHP)

I0758 NIVEL (CHP)

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)

H	0,0020	2,3202	0,0046
H	0,0020	1,1752	0,0024
H	0,0010	81,5126	0,0815
Total:			0,0885

Total Simples: 0,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 0,30

Mara Cristina Martins
ENGENHEIRA CIVIL
RNP. 260307738-4
CREA/SP: 5060851224



CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAÚ-CE
MUNICÍPIO: ACARAÚ-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros
FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SINAPI/CE REF: 09/2024 TABELA SICRO 07/2024 TABELA SEINFRA 28 - NÃO DESONERADO
0
B.D.I 20,73% ENCARGOS SOCIAIS: 114,15

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo	Total
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,50	4.817,36 R\$	16.860,76
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	21.264,65 R\$	21.264,65
TOTAL SIMPLES: R\$						38.125,41

ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSOS
FRAÇÃO DE 100%: R\$	381,25
BDI (20,73%): R\$	79,03
TOTAL GERAL	460,28

Acaraú, 10 de setembro de 2024


Mara Cristina Martins
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 260307738-4
CREA/SP: 6060851224



10/09/2024

Prefeitura Municipal de Acaraú

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

ESCOLHA

Construção de Rodovias e Ferrovias

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	20,73%
Este percentual está na faixa de Referência do BDI.	

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOTADO é:	20,73%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	3,00%
S + G	Seguro e garantia	0,74%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	1,20%
L	Lucro	6,36%
I	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

NÃO

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

NÃO	Não foi necessário orçar mobilização e/ou desmobilização.
SIM	Foi orçado administração local.
NÃO	Não foi necessário orçar canteiro obras.

Responsável Técnico pelo Orçamento

ENG^a. MARA CRISTINA MARTINS

RNP:2603077384

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%

60,00%

3,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPU - EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

set/24

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 20,73%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeitura Municipal de Acaraú



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

CONVÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOS DE ACARAU-CE
MUNICÍPIO: ACARAU-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

TABELA SINAPI/CE REF: 09/2024 SEM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALARIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80%	7,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
D	TOTAL	18,29%	7,38%
TOTAL (A+B+C+D)		114,15%	71,31%

MARA CRISTINA MARTINS
Engenheira Civil
RNP 26030773E-4 CREA 5060851221 SP



VÊNIO: 914377/2024 PROPOSTA: 1078194-80

A:PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIOS DE ACARAU-CE

ICÍPIO: ACARAU-CE Estrada vicinal: Córrego Ana Veríssimo e Ilha dos Coqueiros

TE DOS PREÇOS:

ELA SINAPI/CE REF: 09/2024 TABELA SICRO 07/2024 TABELA SEINFRA 28 - NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
M	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,63%	46.028,00	20,00%	9.205,60	20,00%	9.205,60	20,00%	9.205,60	19,00%	8.745,32	10,00%	4.602,80	11,00%	5.063,08
	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	4.626,21	26,00%	1.202,81	20,00%	925,24	40,00%	1.850,48	14,00%	647,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	MOVIMENTO DE TERRA	2,11%	26.775,61	20,00%	5.355,12	20,00%	5.355,12	20,00%	5.355,12	20,00%	5.355,12	20,00%	5.355,12	0,00%	0,00
	OBRAS DE DRENAGEM	23,20%	294.179,80	20,00%	58.835,96	20,00%	58.835,96	20,00%	58.835,96	20,00%	58.835,96	10,00%	29.417,98	10,00%	29.417,98
	URBANIZAÇÃO	70,69%	896.141,27	20,00%	179.228,25	20,00%	179.228,25	20,00%	179.228,25	20,00%	179.228,25	10,00%	89.614,13	10,00%	89.614,13
		99,99%	R\$ 1.267.750,89												
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				20,02%	253.827,74	20,00%	253.660,17	20,07%	254.475,41	19,94%	252.812,32	10,17%	128.990,03	9,79%	124.095,19
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				1.267.750,89											

MARA CRISTINA MARTINS
Engenheira Civil
RNP 360307738-4 CREA 5960851224 SP



37.477
0006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº ORÇAMENTO	Nº INSCRIÇÃO	GRUPO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
			ANILDO LUIS F. AZEVEDO JUNIOR	AGROPECUARIA SUSTENTAVEL	FOMENTAO SETOR AGROPECUARIO	
PROPRIETARIO / TOMADOR	MUNICIPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO	
	ACARAÚ		CROSSING ANA VERISSIMO E ILHA DOS		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICIPIO DE ACARAÚ	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
				PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICIPIO DE ACARAÚ		

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Elaboração do documento

CREA/CAU

Assinatura

CREA/CAU

ART/ART

CE-30.4152/783





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventografia e Quantitativos

Gravidade
#PUBLICO

1ª OPERAÇÃO 078194-90	Nº SICONV 914377/2021	GIGOV GIGOV/FO - 7129	GESTOR AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	DATA ASSINATURA
ROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE			MUNICÍPIO / UF ACARAU-CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO CORREGO ANA VERISSIMO E ILHA DOS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE	
1ª CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE		INICIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.326.302,62

Total do Orçamento: R\$ 1.526.502,62													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Itens	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	460,28	46.028,00	1-Administração Local	20,88	18,52	30,30	30,30		
Itens	2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	225,78	1.016,01	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50					
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10.693,04	0,36	3.849,49	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.980,00	2.233,04	3.240,00	3.240,00		
Itens	3	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	10.693,04	3,32	35.500,89	3-MOVIMENTO DE TERRA	1.980,00	2.233,04	3.240,00	3.240,00		
Itens	4	OBRAS DE DRENAGEM											
Serviço	4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	3.436,68	43,06	147.983,44	4-OBRAS DE DRENAGEM	600,00	676,68	1.080,00	1.080,00		
Serviço	4.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	M	3.436,68	2,02	6.942,09	4-OBRAS DE DRENAGEM	600,00	676,68	1.080,00	1.080,00		
Serviço	4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	M	3.436,68	40,52	139.254,27	4-OBRAS DE DRENAGEM	1.080,00	1.080,00	600,00	676,68		
Itens	5												
Serviço	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	9.554,04	98,19	938.111,19	5-URBANIZAÇÃO	1.800,00	2.030,04	2.862,00	2.862,00		
Serviço	5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	3,36	311,00	1.044,96	5-URBANIZAÇÃO				3,36		
Serviço	5.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	12,00	547,69	6.572,28	5-URBANIZAÇÃO				12,00		

ACARAU-CE, 16 de abril de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: MARA CRISTINA MARTINS
CREA / CAU: 5060851224SP

1,477 v006 micro



Nº OPERAÇÃO 075194-80	Nº SICONV 614377/2021	GIGOV GIGOV/F2 - T129	GESTOR AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE			MUNICÍPIO / UF ACARAÚ-CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO CORREGO ANA VERISSIMO E ILHA DOS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.326.302,62

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	Evento	Administração Local	R\$	46.028,00
	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00
	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.865,50
	2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	4,50
	2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	10.693,04
	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	35.500,89
	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	10.693,04
	Evento	OBRAS DE DRENAGEM	R\$	294.179,80
	4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.436,68
	4.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.436,68
	4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.436,68
	Evento	URBANIZAÇÃO	R\$	945.728,43
	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	9.554,04
	5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	3,36
	5.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	12,00

VICINAL ILHA DOS COQUEIROS EST 0 A EST 15	VICINAL ILHA DOS COQUEIROS EST 15 A EST 31+18,34	VICINAL CORREGO ANA VERISSIMO EST 0 A EST 27	VICINAL CORREGO ANA VERISSIMO EST 27 A EST 54		
1	2	3	4	5	6
265.464,65	290.337,93	379.887,86	390.612,17	-	-
9.610,65	8.524,39	13.946,48	13.946,48	-	-
20,88	18,52	30,30	30,30	-	-
1.728,81	803,89	1.166,40	1.166,40	-	-
4,50	-	-	-	-	-
1.980,00	2.233,04	3.240,00	3.240,00	-	-
6.573,60	7.413,69	10.756,80	10.756,80	-	-
1.980,00	2.233,04	3.240,00	3.240,00	-	-
70.809,60	74.268,33	72.998,40	76.105,47	-	-
600,00	676,68	1.080,00	1.080,00	-	-
600,00	676,68	1.080,00	1.080,00	-	-
1.080,00	1.080,00	600,00	676,68	-	-
176.742,00	199.329,63	281.019,78	288.637,02	-	-
1.800,00	2.030,04	2.862,00	2.862,00	-	-
-	-	-	3,36	-	-
-	-	-	12,00	-	-

ACARAÚ-CE, 16 de abril de 2025
Local e DataResponsável Técnico: MARA CRISTINA MARTINS
CREA / CAU: 5060851224SP

Nº OPERAÇÃO 078194-R6	Nº SICONV 314377/2021	SIGOV SIGOV/FO - 7126	GESTOR AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE	MUNICÍPIO / UF ACARAÚ-CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO CORREGO ANA VERISSIMO E ILHA DOS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	INÍCIO DA OBRA		

[illegible]ACARAÚ-CE, 16 de abril de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: MARA CRISTINA M
CREA / CAU: 5060851224SP





Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 078194-80	Nº SICONV 014377/2021	GIGOV GIGOVFO - 7129	GESTOR AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador REPÚBLICA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE			Município / UF ACARAÚ-CE	Localidade / Endereço CORREJOANA VERÍSSIMO E ILHA DOS	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	
1º CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE		Início da obra

Medicação: 01

[illegible][illegible]

CARAÚ-CE, 16 de abril de 2025

Resp. Tec. Fiscal.: MARA CRISTINA MARTINS
CREA / CAU: 5060851224SP
ART: CE20241522792



OPERAÇÃO 78194-80	Nº SICONV 914377/2024	GESTOR M. AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	RECURSO LIGU PAC
OPONENTE / TOMADOR EFEITURA MUNICIPAL DE AÇARAÚ			MUNICÍPIO / UF AÇARAÚ/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA VICINAL COR. ANAVERÍSSIMO E LHA DOS LOQUEIROS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AÇARAÚ/CE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AÇARAÚ/CE		REPASSO 955.000,00
					CONTRAPARTIDA 312.750,89
					INVESTIMENTO 1.267.750,89

Início Previsto
jan-25

Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-25	Parcela 2 mar-25	Parcela 3 abr-25	Parcela 4 mai-25	Parcela 5 jun-25	Parcela 6 jul-25
		-	(%)	31,89%	31,81%	8,24%	2,13%	7,28%	18,65%
		-	Repasso (R\$)	304.546,23	303.752,03	78.750,53	20.316,38	69.494,18	178.140,65
		-	CP Fin. (R\$)	99.735,19	99.475,10	25.789,84	6.653,37	22.758,49	58.338,90
		-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	Invest. (R\$)	404.281,42	403.227,13	104.540,37	26.989,75	92.252,67	236.479,55
		-	(%)	31,89%	63,70%	71,94%	74,07%	81,35%	100,00%
		955.000,00	Repasso (R\$)	304.546,23	608.298,26	687.048,79	707.365,17	776.859,35	955.000,00
		312.750,89	CP Fin. (R\$)	99.735,19	199.210,29	225.000,13	231.653,50	254.411,99	312.750,89
		0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.267.750,89	Acum. Inv. (R\$)	404.281,42	807.508,55	912.048,92	939.018,67	1.031.271,34	1.267.750,89
Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE	1.267.750,89	Acumulado (%)	31,89%	63,70%	71,94%	74,07%	81,35%	100,00%
			Acum. Inv. (R\$)	404.281,42	807.508,55	912.048,92	939.018,67	1.031.271,34	1.267.750,89

Local: AÇARAÚ/CE
Data: 16 de abril de 2025

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL



Nº OPERAÇÃO 1078194-80	Nº SICONV 914377/2024	GESTOR M. AGRICULTURA-GROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	RECURSO OGU PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ			MUNICÍPIO / UF ACARAÚCE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA VICINAL COR. ANAVERISSIMO E ILHA DOS COQUEIROS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE		REPASSE 955.000,00
					CONTRAPARTIDA 312.750,88
					INVESTIMENTO 1.267.750,88

										Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF		Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)
	TOTAL									(75,33%) 955.000,00	(24,67%) 312.750,88	(0,00%) -
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	Em Análise	10.028,32	m²		955.000,00	312.750,88	-

TOTAL - ETAPA	1	955.000,00	312.750,88	-	1.267.750,88
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: ACARAÚCE
 Data: 16 de abril de 2025



OPERAÇÃO 78194-80	Nº SICONV 914377/2024	GESTOR M. AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	RECURSO OIGU PAG
OPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			MUNICÍPIO / UF ACARAÚ/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA VICINAL COR. ANAVERISSIMO E ILHA DOS COQUEIROS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	REPASSE 955.000,00
					CONTRAPARTIDA 312.750,88
					INVESTIMENTO 1.267.750,88

Início Previsto
jan-25

Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-25	Parcela 2 mar-25	Parcela 3 abr-25	Parcela 4 mai-25	Parcela 5 jun-25	Parcela 6 jul-25
		-	(%)	31,89%	31,81%	8,24%	2,13%	7,28%	18,65%
		-	Repasse (R\$)	304.546,23	303.752,04	78.750,53	20.316,38	69.494,17	178.140,65
		-	CP Fin. (R\$)	99.735,19	99.475,09	25.789,84	6.653,37	22.758,50	58.338,89
		-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	Invest. (R\$)	404.281,42	403.227,13	104.540,37	26.969,75	92.252,67	236.479,54
		-	(%)	31,89%	63,70%	71,94%	74,07%	81,35%	100,00%
		955.000,00	Repasse (R\$)	304.546,23	608.298,27	687.048,80	707.365,18	776.859,35	955.000,00
		312.750,88	CP Fin. (R\$)	99.735,19	199.210,28	225.000,12	231.653,49	254.411,99	312.750,88
		0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.267.750,88	Acum. Inv. (R\$)	404.281,42	807.508,55	912.048,92	939.018,67	1.031.271,34	1.267.750,88
Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE	1.267.750,88	Acumulado (%)	31,89%	63,70%	71,94%	74,07%	81,35%	100,00%
			Acum. Inv. (R\$)	404.281,42	807.508,55	912.048,92	939.018,67	1.031.271,34	1.267.750,88

Local: ACARAÚ/CE
Data: 16 de abril de 2025

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL





PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.


Local: Município de Acaraú – CE

SETEMBRO- 2024



INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto pavimentação em pedratosca, no município de Acaraú – Ceará.

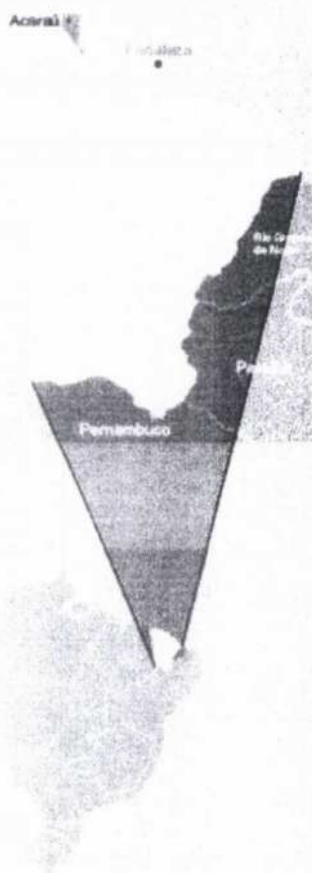

Acaraú localiza-se ao norte do Estado do Ceará e tem como coordenadas geográficas a latitude 2° 53' 08" (S) e a longitude de 40° 07' 12" (W). Com uma área de 842,88 Km², equivale a 0,57% do território estadual. Possui uma altitude média de 13,0m em relação ao Nível do Mar e encontra-se a 255,10 Km da capital. Limita-se ao Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com os municípios de Amontada, Marco e Morrinhos; à Leste com o município de Itarema; e à Oeste com os municípios de Bela Cruz e Cruz. (IPECE, 2010).

Está inserido na Microrregião Geográfica do Litoral de Camocim e Acaraú junto aos municípios de Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Morrinhos. Também faz parte da Mesorregião Geográfica do Nordeste cearense. Encontra-se na Macrorregião de Planejamento do Litoral Oeste – Região Administrativa 3. Existe ainda a divisão territorial por regiões articuladoras de cultura, da Secretaria de Cultura do Ceará, que obedece a mesma formação geográfica



da Macrorregião de Planejamento.

A divisão político-administrativa de Acaraú, de acordo com o IPECE (2010), divide o município em quatro distritos:

Acaraú (Sede), Caussu, Curral Velho e Celsolândia. Possui ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu território. O município está a 255 km de Fortaleza e o seu acesso, a partir da capital, pode ser feito através da CE-085, BR-222, seguindo pela CE-354 e pelas BR's 402 e 403.

Localidade de Ilha dos Coqueiros e Córrego Ana Varíssimo





PROJETO BÁSICO

1.0 OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para execução de serviço de Pavimentação em pedra tosca na estrada vicinal na localidade Lagoa do carneiro do município de Acaraú/CE.

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as Especificações Gerais do DER/CE, para a execução de pavimento em pedra poliédrica.

2.0 SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissionais habilitado acompanhados da respectiva anotação de responsabilidade técnica do CREA/CE.

2.1 PLACA PADRÃO OBRA

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, nas dimensões de 1,50 x 3,00 e padrões a serem fornecidos pelo contratante.

3.0 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.



V. Especificações Técnicas

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento da obra, bem como os funcionários relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais empregados na execução do objeto. Ainda, são consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa administração da obra.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. PLACA DA OBRA.

Será colocada uma placa alusiva à obra nas dimensões (4,00 x 3,00) m, a placa deverá ser confeccionada e chapa de aço galvanizado, espessura 0,03 mm, fixada em linhas de madeira. A placa da obra deverá ser colocada em locais bem visíveis definidos pela fiscalização, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura, nas dimensões indicadas em especificação própria, sempre obedecendo padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo do contratado.

2.2. LOCAÇÃO DA OBRA. A locação será executada com instrumentos, o construtor procederá a locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, solicitando que a fiscalização, por seu topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua responsabilidade. A Construtora procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a área de execução de locação, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer às tolerâncias referentes as dimensões e objetos a serem locados. Não devem ser utilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferições futuras. A contratante dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, de qualquer modo o disposto no parágrafo seguinte. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implica para o construtor na obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de acordo com o contrato.



3 – MOVIMENTO DE TERRA

3.1.- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BUBLEITO

Destinada a conformar o leito da via, quando necessário, transversal longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de espessura.

De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais como: escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc., de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.

No caso de adição de materiais, estes deverão obedecer às seguintes condições:

- a) Diâmetro máximo da partícula menor ou igual 76 mm;
- b) ISC determinado pelo método AASHO T-99 (Normal), igual ou maior ao do material considerado no dimensionamento do pavimento como representativo do trecho em execução;

Expansão menor ou igual a 2%. São indicados os seguintes equipamentos:

- a) Motoniveladoras pesadas com escarificador;
- b) Veículos distribuidores de água;
- c) Rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos;
- d) Grades de discos.

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

4 – OBRAS DE DRENAGEM

4.1.1 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO – 80X08X08X25 CM

Todo meio fio adquirido, também denominado como guias, será de concreto simples com as dimensões apresentadas em projeto anexo e com resistência mínima à compressão de 10 Mpa, inclusive colocação e pintura de meio-fio. Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo será apiloado, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos no projeto. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

4.1.2 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

Será executada a pintura externa com cal hidratado 02(duas) demão sobre a banqueta, obedecendo a execução de uma boa penetração da pintura, em toda a área aparente com excelente uniformidade na execução da pintura.



4.2.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO – 30CM BASE X 10 CM DE

ALTURA

Este dispositivo de drenagem longitudinal será executado lateralmente as vias que foram pavimentadas, para o fácil escoamento das águas pluviais e conservação da pavimentação.

Será executada em concreto simples nas seguintes dimensões, largura de 0,30 m e espessura de 0,10m.

Todos os materiais utilizados para sua execução deverão satisfazer os requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

O concreto utilizado terá uma resistência à compressão mínima de 15Mpa.

5. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICAS C/ REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

5.1 - GENERALIDADES Os pavimentos de pedra tosca são constituídos de pedras irregulares, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer às condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

5.2 – EXECUÇÃO

Será executada com pedras irregulares de granito de boa qualidade, sem vestígio de decomposição ou alteração, com dimensões variando entre 10 a 15 cm, que deverão ser cravadas justapostas em um colchão de areia de morro e piçarra na proporção 1:1 estabilizada granulometricamente, de tal maneira a não deixar juntas superiores a 1,5cm.

A espessura mínima do colchão deverá ser de 15 cm de tal forma que a camada final, colchão de areia + pedra tosca, compactada, fique com 20 cm. Não será permitido o assentamento de pedras de modo a se comportarem como lajes. As pedras fortemente compactadas mecanicamente com compactador tipo sapo até a superfície ficar firme e terminada de acordo com a declividade, o alinhamento e a seção transversal de projeto.

5.3 – CONTROLE

O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecido pelo Projeto. Controle de Material As amostras de pedra para os exames visuais deverão ser colhidas segundo os critérios estatísticos como se segue: A quantidade fornecida deverá ser dividida em lotes de 2 milheiros. De cada lote será separada, ao acaso, uma amostra de 5% das pedras. Se 90% das peças satisfizerem os exames visuais, o lote será aceito, caso contrário será rejeitado. Um lote rejeitado poderá ainda ser aceito se forem substituídas as peças defeituosas de forma a enquadrá-la na Especificação. A aceitação no exame visual não impede que o lote seja rejeitado se não satisfizerem os ensaios de laboratórios conforme estabelecido no item Materiais. Controle Geométrico A superfície do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua de 3,0m de comprimento sobre ela disposta, em qualquer direção, depressão superior a 0,01m. A espessura da camada de areia para assentamento não poderá diferir em mais ou menos 10% da espessura fixada do Projeto.




A espessura admitida para as juntas das pedras será de, no máximo, 0,015m numa fileira completa, permitindo-se que 30 % das juntas excedam este limite.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

6.0 NORMA


São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

MARA CRISTINA MARTINS
Engenheira Civil
RNP 260307738-4 CREA 5060851224 SP

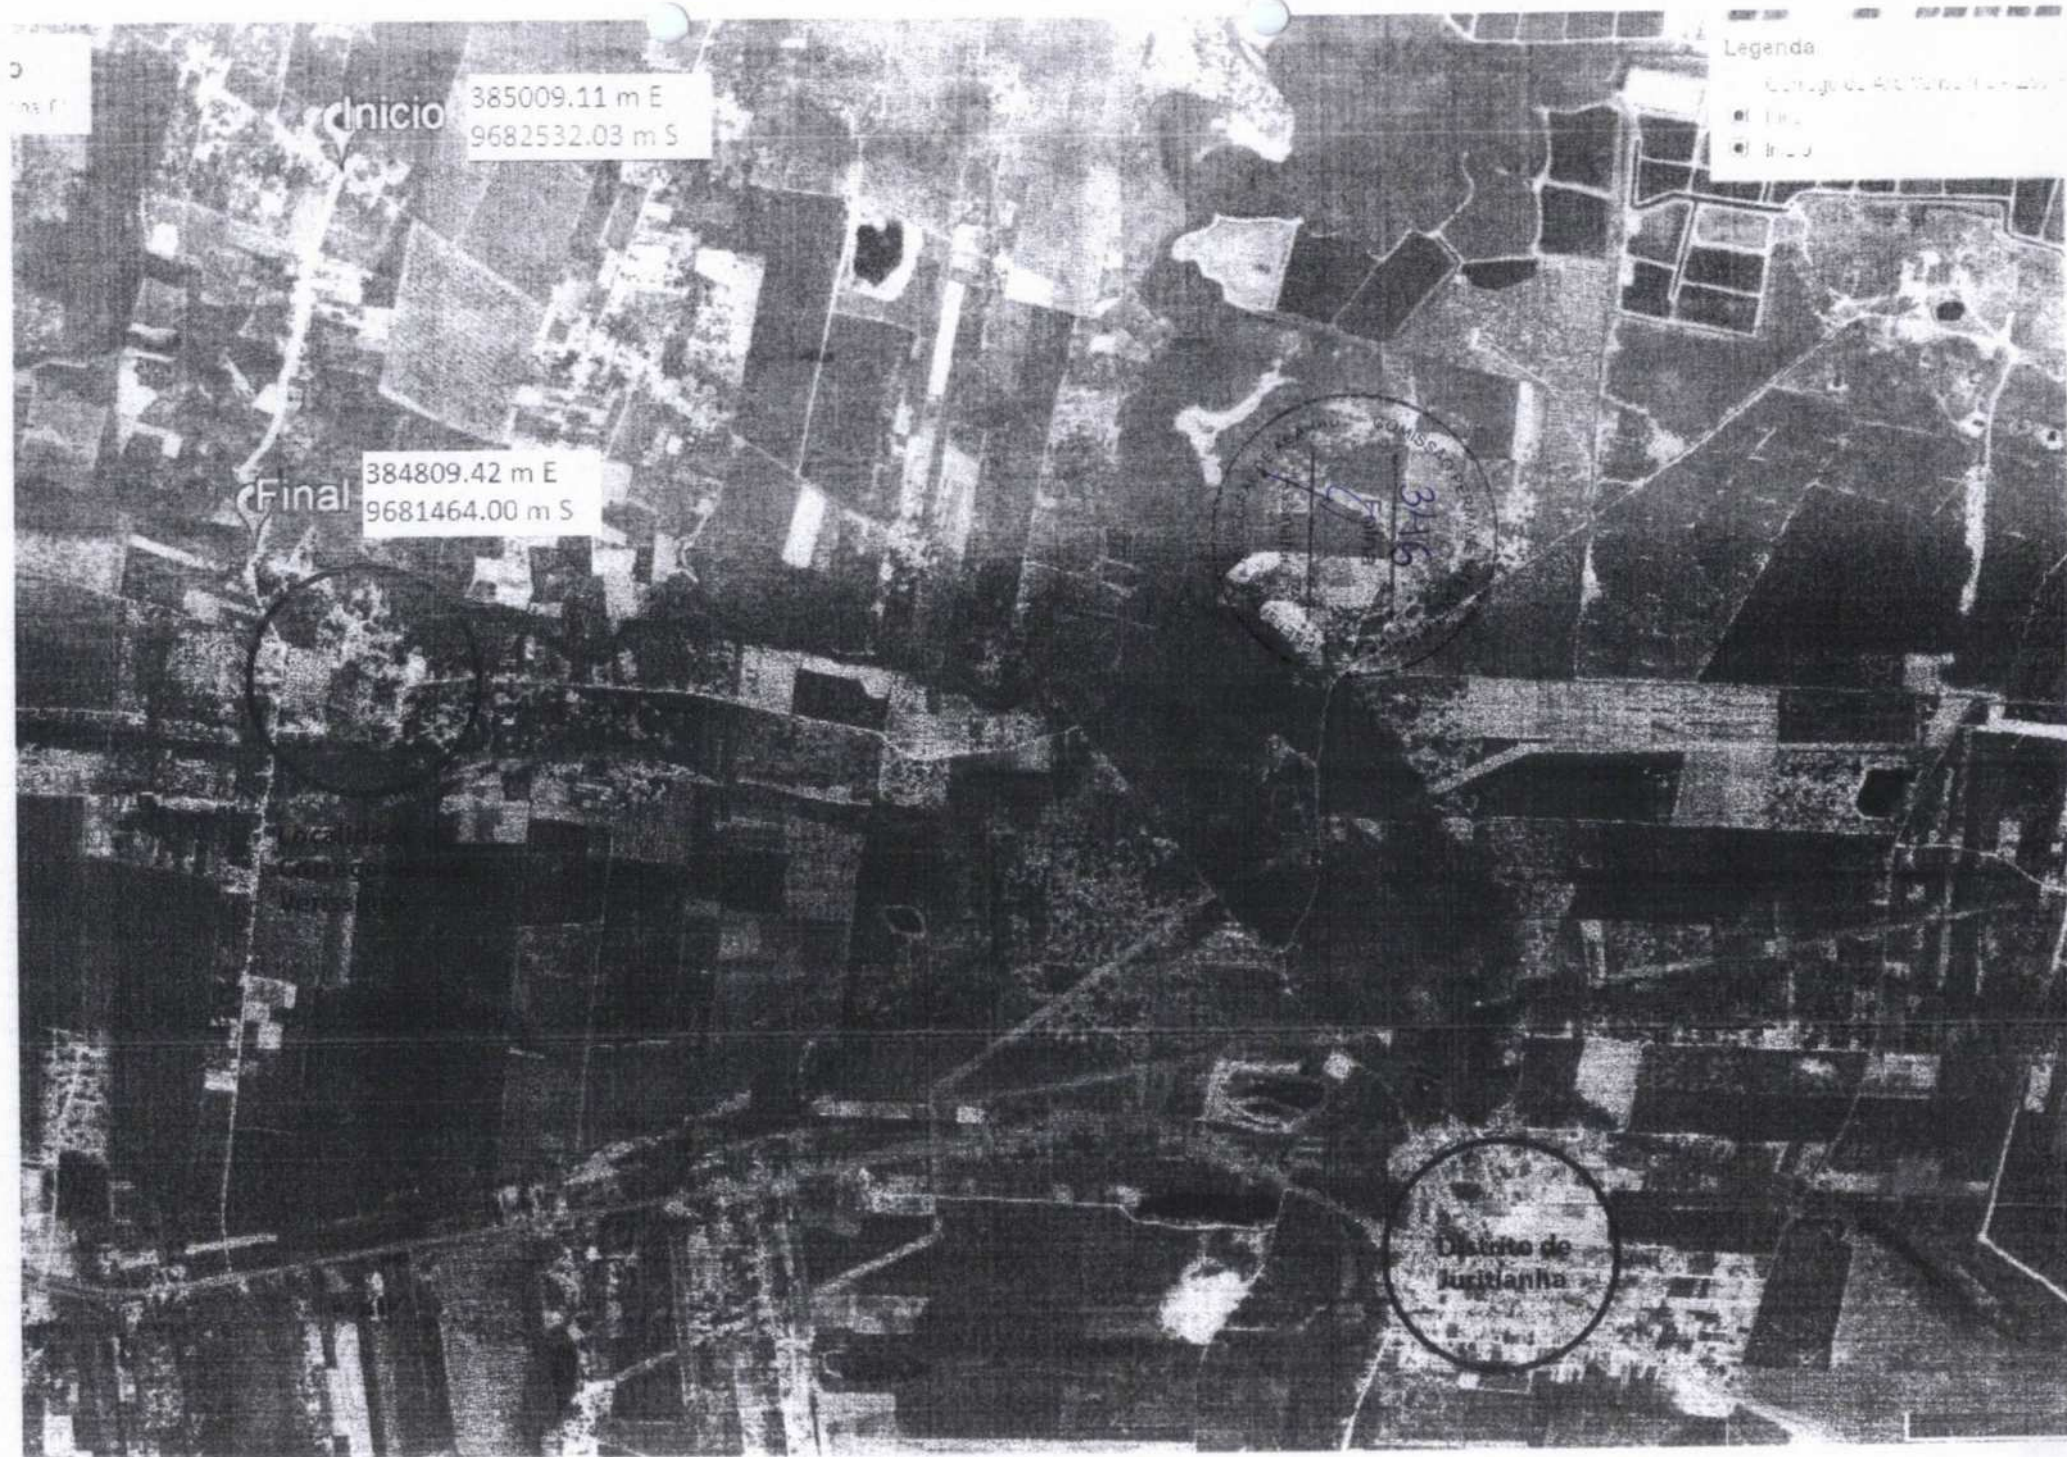





MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRENO EM RELAÇÃO ÀS RUA VERISSIMO - ACARAÚ

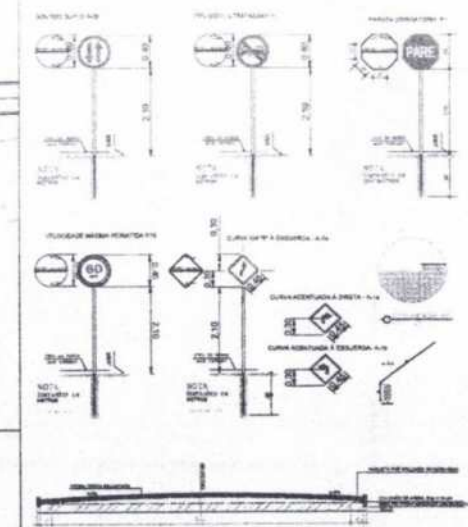



PROJETO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO APROVADO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.201/11 DATA: 21/03/2011 ASSINATURA: CARIMBO:	
PLANO: DATA: ESCRITÓRIO:	TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO PEDA TOSCA NA ESTRADA VICINAL 01 LOCALIDADE: CORREGO DE ANA VERISSIMO - ACARAÚ EXTENSÃO VICINAL: 01 - CORREGO DE ANA VERISSIMO PTO A PTO - EXTENSÃO: 100,00m - LARGURA: 6,00m - ANEL: 0,00m



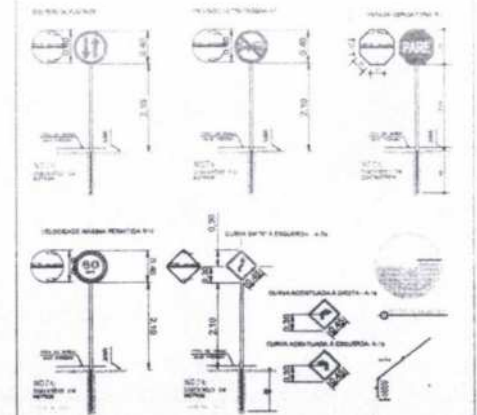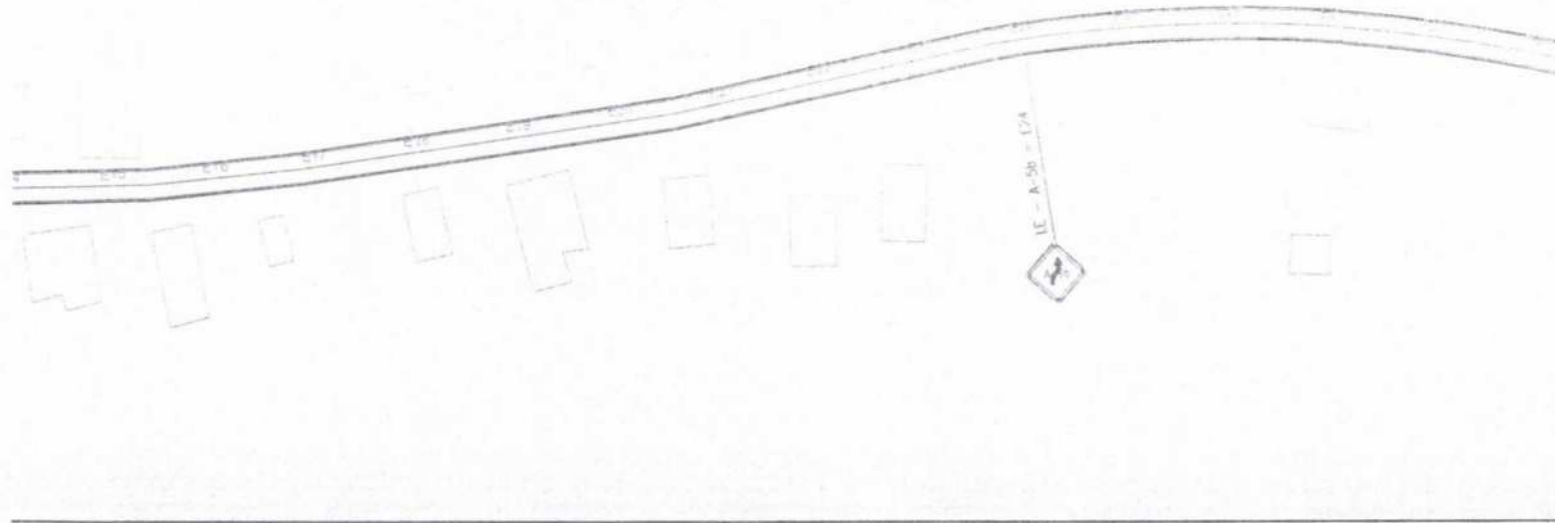


Convenções topográficas:	
	estação
	pedra tosca
	água
	muro
Convenções projeto:	
	est. estacionado de 30 em 30 metros
	nível do terreno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Assinatura: _____ Folha: 348	
NOME: _____ ENDEREÇO: _____ CATEGORIA: _____	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO APROVADO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.121 DATA: 22/07/2020 LOCAL: ACARAÚ - PERNAMBUCO PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 14.121/20
NOME: _____ ENDEREÇO: _____ CATEGORIA: _____	INVENIENTAÇÃO PEDRA TOSCA NA ESTRADA VICINAL 01 Localização de Corrego de Ana Veríssimo - Acaraú/CE ESTRADA VICINAL 01 - CORREGO DE ANA VERÍSSIMO 010 A 014 - ENTORNO: 010000 - LARGURA: 0,00 - ÁREA: 0000,00 m²
DATA: _____ ASSINATURA: _____	DATA: _____ ASSINATURA: _____

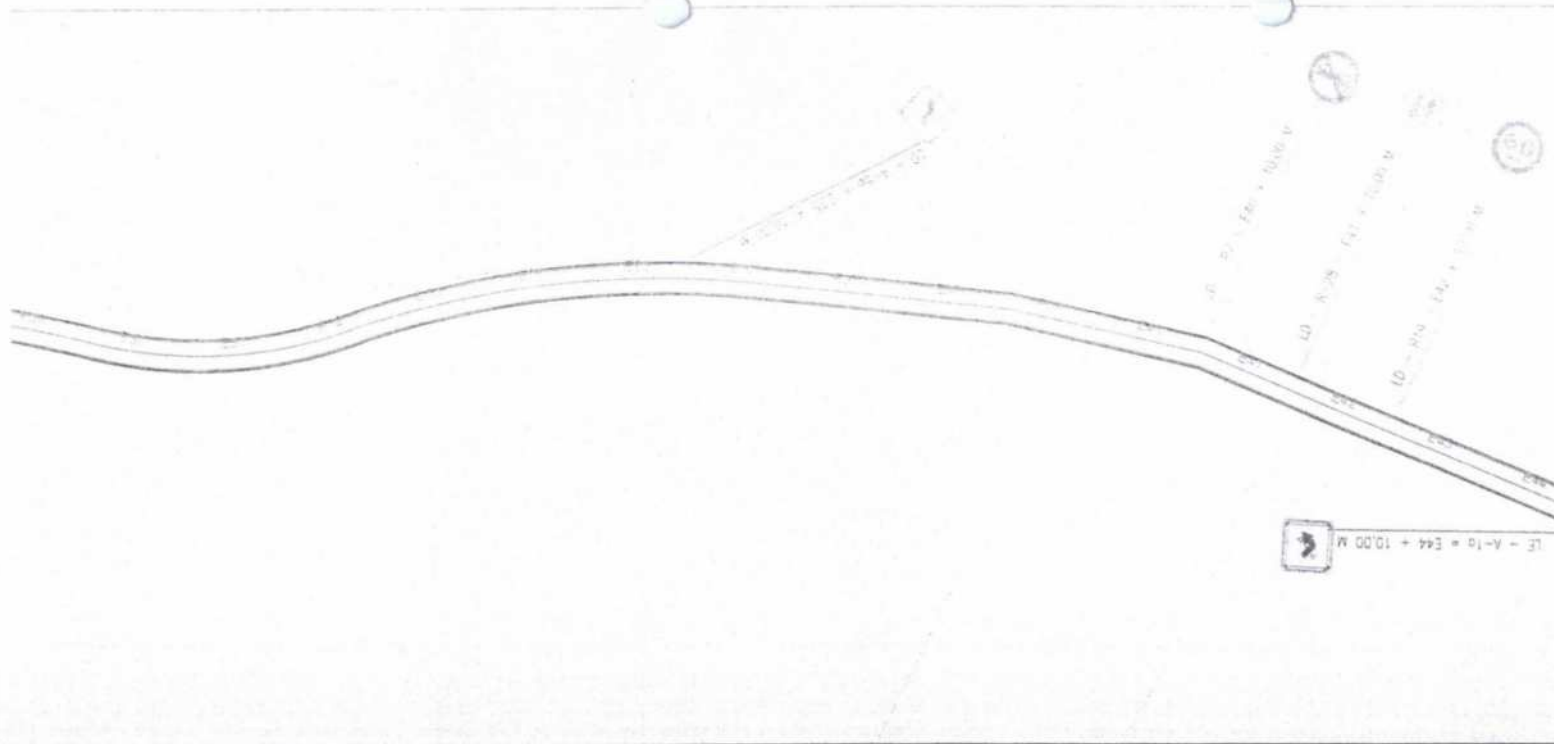

MAPA AEROFOTOGRAFICO DO TERRENO EM CONTO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO

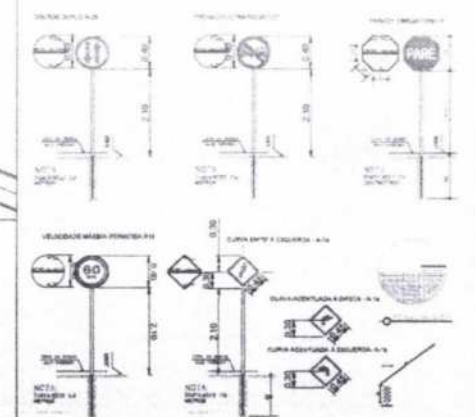

Convenções topográficas:	
	ELEVACAO
	PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA
	PAVIMENTO EM CIMENTO
Convenções projeto:	
	ESTRADA DE 30 M DE LARGURA
	PERFIL DO TERRENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO DE PAVIMENTACAO NOVA TERRA (Lote 10 e 11) DATA: 15/05/2018 ASSINATURA: [Assinatura] RUBRICA: [Rubrica]	
PROJETO COORDENADOR TITULO DATA REVISAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO DE PAVIMENTACAO NOVA TERRA (Lote 10 e 11) DATA: 15/05/2018 ASSINATURA: [Assinatura] RUBRICA: [Rubrica]
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA VICINAL 01 Localizada no Corrego de Ana Verissimo - Acaraú/CE ESTRADA VICINAL 01 - CORREGO DE ANA VERISSIMO 100 A 120 M - EXTENSÃO: 200,00 M - LARGURA: 3,00 M - AREA: 600,00 M²	
ESCALA: 1/500 DATA: 15/05/2018 PROJETO: 1/500	ESCALA: 1/500 DATA: 15/05/2018 PROJETO: 1/500



Legenda
[Symbol] Final
[Symbol] Indio
[Symbol] Indio

Final
384160.24 m E
9685601.51 m S

Indio
383666.80 m E
9685285.41 m S

351
Folha
Assinatura
MUNICÍPIO DE AÇAI
ZONA DE PROTEÇÃO PERMANENTE



Localidade
Café



Final





Foto de AEROFOTOGRAFIA DO TRECHO DE OBRAS DO PROJETO - ILHA DOS COQUEIROS

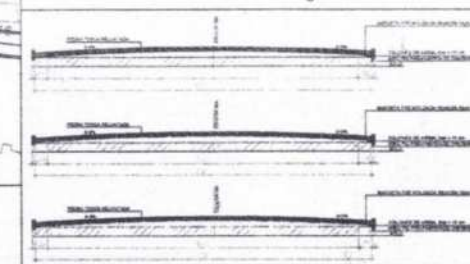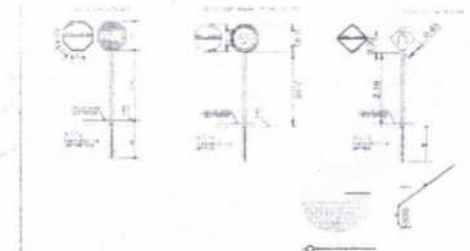


Convenções topográficas:	
	ELEVACÃO
	ÁGUA
	PEDRA-TOSCA
	RODA
Convenções projeto:	
	ESTRUTURA DE 20 M DE LARGURA
	PERFIL DO TERRENO

PROJETO CONTERNO ELABORADO		PREFETURA MUNICIPAL DE AGARUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO APROVADO NOME TÉCNICO DA LÍNEA DE PROJETO ASSINATURA DATA PROJETO APROVADO
PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA-TOSCA NA ESTRADA VICINAL 01 Localidade de Ilha dos Coqueiros - Aguará		PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA-TOSCA NA ESTRADA VICINAL 01 Localidade de Ilha dos Coqueiros - Aguará Trecho 01 - 010 a 017 - EXTENSÃO 140m - ÁREA: 840,00 m² - LARGURA: 6,0m Trecho 02 - 017 a 024 - EXTENSÃO: 42,00m - ÁREA: 252,00 m² - LARGURA: 6,0m Trecho 03 - 024 a 031 - EXTENSÃO: 42,00m - ÁREA: 252,00 m² - LARGURA: 6,0m Trecho 04 - 031 a 038 - EXTENSÃO: 42,00m - ÁREA: 252,00 m² - LARGURA: 6,0m




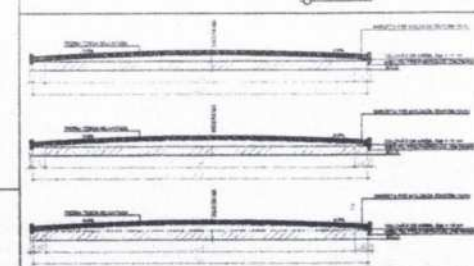

Convenções topográficas:



Convenções projeto:



PROJETO COORDENADOR ELABORADOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ DEPT. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA TORÇÃO DA ILHA DOS COQUEIROS DATA: 21/03/2018 PROJETO: PAVIMENTAÇÃO PEDARA TOSCA NA ILHA DOS COQUEIROS
PROJETO PAVIMENTAÇÃO PEDARA TOSCA NA ILHA DOS COQUEIROS ESTRADA VICINAL 01 - ILHA DOS COQUEIROS Tramo 01 - 000 a 007 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 1.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 02 - 007 a 009 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 03 - 009 a 010 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 04 - 010 a 011 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 05 - 011 a 012 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m		PROJETO PAVIMENTAÇÃO PEDARA TOSCA NA ILHA DOS COQUEIROS ESTRADA VICINAL 01 - ILHA DOS COQUEIROS Tramo 01 - 000 a 007 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 1.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 02 - 007 a 009 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 03 - 009 a 010 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 04 - 010 a 011 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m Tramo 05 - 011 a 012 - EXTENSÃO: 40,00m - ÁREA: 2.000,00m² - LARGURA: 6,00m



LICENÇA DE INSTALAÇÃO		LIBERAÇÃO: 2024.10.30-0002	
Número processo:	24.10.28-0002	Vigência:	30/10/2024 - 30/10/2025
Requerente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU		
CNPJ/CPF:	07.547.821/0001-91		
Contato:	() -		
Endereço do empreendimento:	RUA MAJOR COELHO, 185 - CENTRO - CEP: 62.580-000 - ACARAU-CE		
Coordenadas:	Latitude: 02°52'53,11"S - Longitude: 40°7'8,58"O		
Atividade:	28 - INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE 28.06 - RODOVIAS - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		
Especificação:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO DE ANA VERISIMO (6480 M²- INICIO: 385009.11/9682532.03; FIM: 384809.42/9681464.00) E ILHA DOS COQUEIROS (4213,04 M²- INICIO: 9685285.41/383666.80; FIM: 9685601.51/384160.24).		



O Secretário do Meio Ambiente de Acarau - SEMMA, no uso de suas atribuições legais e de direito, conforme a Lei Federal nº 6938/81, e as Leis Municipais nº 1409/2011, 1412/2011, 1413/2011, 1571/2014, bem como a Resolução do CONAMA nº. 237/97 expede a presente LICENÇA DE INSTALAÇÃO.

CONDICIONANTES COM PRAZO

- ✓ Afixar em local de fácil visualização placa indicativa do licenciamento ambiental pela SEMMA, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Licença.
- ✓ A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Resolução COEMA Nº 10/2015 e Lei Complementar 023/2020, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMMA. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito à prorrogação automática da validade da Licença.

CONDICIONANTES GERAIS

- ✓ Submeter à prévia análise da SEMMA qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento.
- ✓ Cumprir, rigorosamente, a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
- ✓ A constatação da falsa declaração implica em suspensão ou cancelamento da licença expedida, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, conforme Artigo 27, da Resolução COEMA Nº 02, de 11 de abril de 2019.
- ✓ Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ao meio ambiente.
- ✓ Qualquer modificação do empreendimento deverá ser avisada previamente à SEMMA, estando o interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal Nº 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais.
- ✓ Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à fiscalização da SEMMA.
- ✓ Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição o meio ambiente
- ✓ O empreendimento ficará passível de fiscalização pela SEMMA.
- ✓ Promover a proteção à fauna e flora locais.
- ✓ Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).
- ✓ A SEMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
 - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença.
- ✓ Esta licença não contempla intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APP, estando o interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais.
- ✓ O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados.



- ✓ Não queimar ao ar livre os resíduos sólidos, semi-sólidos, líquidos ou de qualquer outro material combustível, exceto mediante autorização de órgão público competente.
- ✓ Gerenciar os resíduos produzidos pela atividade.

Acaraú/CE, 30 de Outubro de 2024.

JOSE ITAMAR FERREIRA
GOMES:65131096391

Assinado de forma digital por JOSE
ITAMAR FERREIRA
GOMES:65131096391
Dados: 2024.11.29 08:32:46 -03'00'

José Itamar Ferreira Gomes
Secretário Municipal de Meio Ambiente





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241522792

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico
MARA CRISTINA MARTINS
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 2603077384
Registro: 42998CE

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Acaraú
RUA Nicodemos Araujo
Complemento:
Cidade: ACARAÚ

CPF/CNPJ: 07.547.821/0001-91
Nº: 2105
Bairro: Vereador Antônio Livino de O
UF: CE CEP: 62580000
ART Vinculada: CE20210847883

Contrato: 06/24 Celebrado em: 03/04/2024
Valor: R\$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

COMUNIDADE Ilha dos Coqueiros e correjo Ana Veríssimo Nº: s/n
Complemento: Ilha dos Coqueiros e correjo Ana Veríssimo Bairro: Ilha dos Coqueiros e correjo Ana Veríssimo
Cidade: ACARAÚ UF: CE CEP: 62580000
Data de Início: 03/04/2024 Previsão de término: 04/10/2027 Coordenadas Geográficas: -2.918818, -40.122518
Finalidade: Infraestrutura Código: 62580-000
Proprietário: Prefeitura Municipal de Acaraú CPF/CNPJ: 07.547.821/0001-91

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	9.554,04	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	9.554,04	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	9.554,04	m2
80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.11 - DE ACESSIBILIDADE DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	9.554,04	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	9.554,04	m2
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	9.554,04	m2
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	9.554,04	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	9.554,04	m2
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.11 - DE ACESSIBILIDADE DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	9.554,04	m2
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	9.554,04	m2
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	9.554,04	m2
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	9.554,04	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	9.554,04	m2
60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.11 - DE ACESSIBILIDADE DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	9.554,04	m2
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	9.554,04	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto, orçamento, memoria de calculo e descritivo, acessibilidade e fiscalização SIGOV914377/21, OP1078194-80, adequação de estradas vicinais Corrego Ana verissimo e ilha dos Coqueiros, pav pedra tosca, area a pavimentar 9.554,04m2





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241522792

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

MARA CRISTINA MARTINS - CPF: 141.056.658-71

Prefeitura Municipal de Acaraú - CNPJ: 07.547.821/0001-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 24/10/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217415406

